

Projeto Interdisciplinar II

Entrega da Aula 2 — Levantamento de Requisitos e Plano de Projeto de TI

0. Identificação do Projeto

Grupo: Eventos Star

Tema: Celebre Wedding & Festas

Integrantes: João Victor Tiburcio, Marcia Aparecida de Moraes Faria, Igor Souza do Nascimento, Adrielly Menezes Viana e Lucila Biasini

Plataforma web para divulgar profissionais de eventos, gerenciar inscrições e confirmar presenças em festas de casamento e debutantes, conectando clientes e fornecedores sem intermediar negociações e em conformidade com a LGPD.

1. Requisitos Funcionais

Código	Descrição	Prioridade
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de clientes, especialmente noivas e debutantes, para que possam participar dos eventos disponibilizados pela plataforma.	Alta
RF02	O sistema deve permitir o cadastro dos profissionais e expositores que oferecem produtos ou serviços relacionados à realização de casamentos, festas de debutantes e outros eventos.	Alta
RF03	O sistema deve permitir o cadastro e a apresentação dos produtos oferecidos pelos profissionais, contendo informações necessárias para que as clientes possam conhecê-los.	Alta
RF04	O sistema deve permitir o cadastro e a divulgação dos serviços oferecidos pelos profissionais, possibilitando que as clientes conheçam as opções disponíveis para seus eventos.	Alta
RF05	O sistema deve exibir a lista de profissionais cadastrados contendo nome/razão social, categoria, foto de capa, descrição curta dos serviços/produtos e pelo menos um canal de contato público (ex.: WhatsApp ou Instagram), permitindo que as clientes encontrem fornecedores relacionados ao tipo de evento que estão planejando.	Alta
RF06	O sistema deve permitir que as clientes consultem as informações dos produtos e serviços divulgados pelos profissionais participantes da plataforma.	Alta
RF07	O sistema deve permitir o cadastro e a divulgação da programação dos eventos, apresentando as atividades previstas de forma organizada para os participantes.	Alta
RF08	O sistema deve permitir que as noivas e debutantes realizem sua inscrição nos eventos mediante preenchimento obrigatório dos campos nome completo, e-mail, celular, tipo de evento (casamento ou debutante) e aceite do termo de privacidade.	Alta
RF09	O sistema deve registrar as inscrições realizadas pelas participantes, associando cada inscrição ao respectivo evento.	Alta
RF10	O sistema deve permitir que a participante confirme sua presença em um evento no qual esteja inscrita, por meio de um botão no e-mail de confirmação ou informando o e-mail cadastrado na tela de confirmação (RSVP).	Alta
RF11	O sistema deve permitir o controle das confirmações de presença, possibilitando identificar quais participantes confirmaram participação no evento.	Alta

RF12	O sistema deve disponibilizar as informações da programação do evento para as participantes inscritas, facilitando o acompanhamento das atividades.	Média
RF13	O sistema deve enviar uma mensagem de agradecimento após o evento para as participantes, conforme previsto no escopo do projeto.	Média
RF14	O sistema deve disponibilizar, na mensagem de agradecimento, os contatos dos profissionais apresentados no evento, permitindo que as clientes possam procurá-los posteriormente.	Média
RF15	O sistema deve centralizar em uma única plataforma as informações sobre eventos, programação, profissionais, produtos, serviços, inscrições e confirmações de presença.	Alta
RF16	O sistema deve permitir que os usuários (clientes, profissionais e administradores) façam login com usuário e senha.	Alta
RF17	O sistema deve permitir que os usuários editem seus próprios dados cadastrais.	Média
RF18	O sistema deve permitir que a cliente visualize as inscrições que realizou.	Média
RF19	O sistema deve permitir que o administrador gerencie (aprove, edite ou remova) os cadastros de profissionais.	Média
RF20	O sistema deve permitir que o administrador gerencie a programação dos eventos cadastrados.	Média
RF21	O sistema deve permitir a validação e confirmação de acesso presencial dos participantes no dia do evento (check-in), por meio da leitura de QR Code ou validação de token, atualizando o status da lista de presença em tempo real.	Média

RF16 a RF20 foram incluídos a partir da análise técnica de Igor (desenvolvimento): cobrem login/autenticação e a gestão administrativa da plataforma, pontos necessários para o MVP da Aula 6 que ainda não estavam formalizados.

RF21 foi incluído durante o desenho do fluxo TO-BE (Aula 3): a atividade automatizada "Validar Check-in por QR Code / Token no Evento" não possuía requisito funcional explícito no levantamento original.

2. Requisitos Não Funcionais

Código	Descrição	Prioridade
RNF01	O sistema deve ser disponibilizado como uma plataforma web, permitindo seu acesso por meio de navegador e evitando que as funcionalidades dependam de processos exclusivamente manuais ou dispersos.	Alta
RNF02	O sistema deve garantir a proteção e privacidade dos dados pessoais das clientes: nenhuma interface ou endpoint deve exportar ou listar esses dados para profissionais/terceiros, e a base de dados deve registrar o consentimento (data/hora e versão do termo aceito) no momento da inscrição.	Alta
RNF03	O sistema deve apresentar as informações de eventos, profissionais, produtos e serviços de maneira organizada, clara e compreensível, facilitando a localização das informações pelas clientes.	Média
RNF04	O sistema deve proporcionar facilidade de uso para seu público-alvo: as telas públicas (programação, vitrine, inscrição e confirmação de presença) devem se adaptar corretamente a resoluções de smartphone (360px a 430px de largura), sem necessidade de rolagem horizontal.	Alta
RNF05	O sistema deve manter as informações das participantes e das inscrições de forma controlada e segura, restringindo o acesso aos dados conforme sua finalidade dentro da plataforma.	Alta
RNF06	O tempo de carregamento inicial das páginas de vitrine de profissionais e de programação do evento não deve exceder 3 segundos em conexão 4G padrão.	Média

RF05, RF08, RF10, RNF02 e RNF04 foram refinados, e o RNF06 foi incluído, a partir da revisão de testabilidade feita por Lucila (testes): cada requisito passou a trazer critérios objetivos e verificáveis, conforme a orientação do professor de que "um requisito bem escrito é testável".

3. Perfis de Usuário (Atores)

- Cliente (noiva/debutante): cadastra-se, navega pelos profissionais e seus produtos/serviços, inscreve-se em eventos, confirma presença e recebe os contatos dos profissionais após o evento.
- Profissional/Expositor: cadastra-se, divulga seus produtos e serviços, atualiza suas informações de contato.
- Administrador: aprova ou recusa cadastros de profissionais, divulga a programação dos eventos e gera relatórios.
- Visitante (não cadastrado): navega pela plataforma e visualiza profissionais e programação, sem se inscrever.

4. Regras de Negócio

Código	Descrição	Prioridade
RN01	Os dados pessoais das clientes não devem ser repassados aos profissionais ou expositores, respeitando a proposta do projeto e os princípios de proteção de dados estabelecidos pela LGPD.	Alta
RN02	O sistema não deve realizar ou intermediar negociações entre as clientes e os profissionais/expositores. A plataforma deverá apenas possibilitar a divulgação e a conexão entre as partes.	Alta
RN03	Os profissionais cadastrados devem ser apresentados juntamente com seus respectivos produtos e/ou serviços, permitindo que as clientes conheçam as opções disponíveis para a realização de seus eventos.	Alta
RN04	Os contatos dos profissionais poderão ser disponibilizados às clientes após o evento por meio da mensagem de agradecimento, permitindo que a própria cliente realize o contato posteriormente.	Média
RN05	A plataforma deve centralizar as informações relacionadas à programação dos eventos, inscrições e confirmações de presença, substituindo a organização manual e dispersa identificada no problema do projeto.	Alta

5. Backlog do Produto — Histórias de Usuário

ID	História de usuário	Prioridade
HU01	Como cliente, quero me cadastrar na plataforma, para que eu possa me inscrever em eventos e visualizar profissionais.	Alta
HU02	Como cliente, quero visualizar a lista de profissionais disponíveis, para que eu escolha os que atendem à minha festa.	Alta
HU03	Como cliente, quero filtrar profissionais por categoria de serviço, para que eu encontre rapidamente o que preciso.	Média
HU04	Como cliente, quero me inscrever em um evento, para que eu garanta minha participação.	Alta
HU05	Como cliente, quero confirmar minha presença no evento, para que os organizadores tenham o número correto de participantes.	Alta
HU06	Como cliente, quero cancelar minha inscrição, para que eu libere minha vaga caso não possa comparecer.	Média
HU07	Como cliente, quero receber os contatos dos profissionais após o evento, para que eu possa buscá-los diretamente.	Alta
HU08	Como profissional, quero me cadastrar na plataforma, para que meus produtos e serviços sejam divulgados às clientes.	Alta
HU09	Como profissional, quero atualizar minhas informações de contato, produtos e	Média

	serviços, para que os dados exibidos estejam sempre corretos.	
HU10	Como administrador, quero aprovar o cadastro dos profissionais, para que apenas fornecedores confiáveis apareçam na plataforma.	Alta
HU11	Como administrador, quero divulgar a programação do evento, para que as clientes saibam os horários e atividades.	Alta
HU12	Como administrador, quero gerar relatório de inscrições por evento, para que eu tenha controle sobre o número de participantes.	Média
HU13	Como cliente, quero receber uma notificação por e-mail ao concluir minha inscrição, para que eu tenha a confirmação do meu cadastro.	Média
HU14	Como administrador, quero gerar relatório de profissionais por categoria, para que eu identifique áreas com poucos fornecedores cadastrados.	Baixa
HU15	Como usuário, quero fazer login com usuário e senha, para que eu acesse minha conta com segurança.	Alta
HU16	Como cliente, quero visualizar a programação dos eventos, para que eu escolha a data e o horário que desejo participar.	Alta
HU17	Como cliente, quero visualizar as inscrições que já realizei, para que eu acompanhe os eventos em que estou participando.	Média
HU18	Como administrador, quero gerenciar a programação dos eventos, para que as informações estejam sempre atualizadas e corretas.	Média


6. Cenário do Levantamento

O projeto não possui cliente real neste momento. O cenário foi construído a partir de premissas baseadas em situações comuns de organização de festas de casamento e debutantes, observadas informalmente pelo grupo. Premissas assumidas:

- A maioria das noivas e debutantes pesquisa fornecedores em redes sociais e grupos de WhatsApp, sem um canal único e confiável.
- Os profissionais de eventos (buffet, decoração, fotografia, etc.) divulgam seus produtos e serviços de forma dispersa, cada um em seu próprio canal.
- A confirmação de presença em eventos costuma ser feita informalmente, gerando erros de contagem de convidados.
- A plataforma não deve armazenar nem intermediar valores financeiros, apenas conectar clientes e profissionais.

7. EAP — Estrutura Analítica do Projeto

EAP completa do semestre, elaborada pela equipe: 7 pacotes de trabalho (Documentação, Modelagem, Banco de Dados, Front/Back-end, Integração, Testes e Apresentação), cada um com seu responsável principal e os itens já referenciados à aula em que serão entregues.

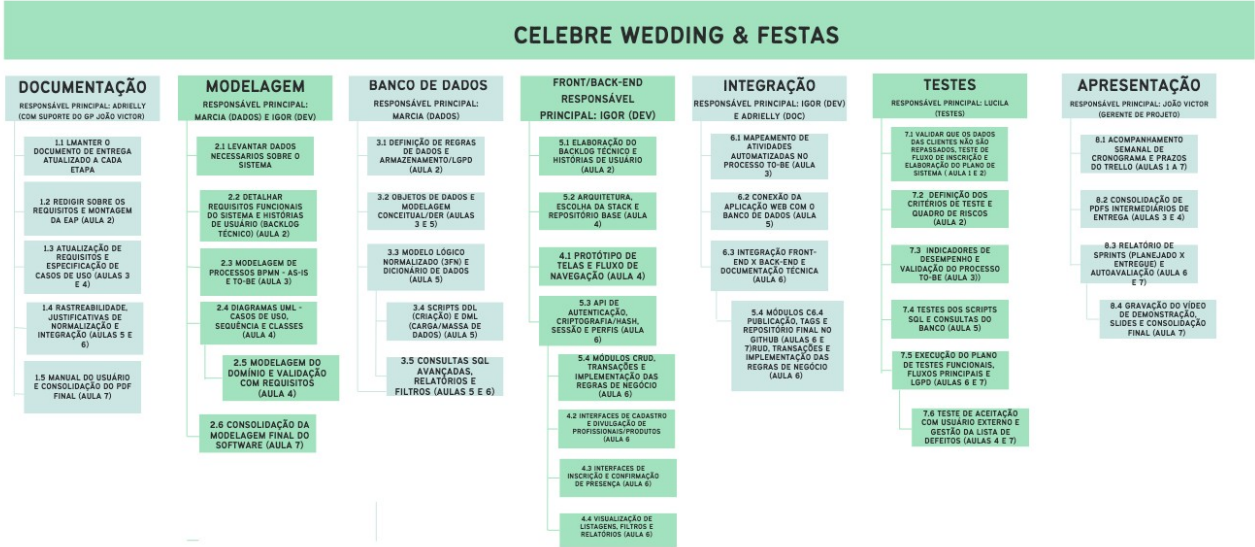

8. Cronograma até 29/11/2026

Proposta do grupo, distribuída pelas quinzenas do semestre e alinhada às sete entregas da disciplina.

Quinzena	Período	Pacotes da EAP	Marco
1	26/08 – 06/09	Documentação — formação da equipe e escolha do tema	Aula 1 — concluída
2	09/09 – 20/09	Documentação — requisitos e plano de projeto	Aula 2 — atual
3	21/09 – 04/10	Modelagem (dados e casos de uso)	Aula 3
4	05/10 – 18/10	Modelagem UML + início do Front/Back-end	Aula 4
5	19/10 – 01/11	Banco de Dados + Front/Back-end	Aula 5
6	02/11 – 15/11	Front/Back-end + Integração + MVP (requisitos de prioridade Alta)	Aula 6 — MVP
7	16/11 – 29/11	Testes + Apresentação final	Aula 7 — final

9. Matriz de Responsabilidades

Pacote da EAP	Responsável principal
Documentação	Adrielly Menezes Viana (com suporte do GP João Victor)
Modelagem	Marcia Aparecida de Moraes Faria (Dados) e Igor Souza do Nascimento (Dev)
Banco de Dados	Marcia Aparecida de Moraes Faria (Dados)
Front/Back-end	Igor Souza do Nascimento (Dev)
Integração	Igor Souza do Nascimento (Dev) e Adrielly Menezes Viana (Doc)
Testes	Lucila Biasini (Testes)
Apresentação	João Victor Tiburcio (Gerente de Projeto)

10. Riscos

ID	Descrição do risco	Categoria	Prob. / Impacto	Ação preventiva (mitigação)	Plano de contingência	Responsável
R01	Integrante deixar a disciplina/equipe	Pessoas / Gestão	Média / Alto	Definir divisão clara de tarefas, documentar decisões no repositório e manter o código modular para facilitar o repasse.	Reorganizar e redistribuir os módulos e tarefas do integrante entre os membros remanescentes.	Líder do Projeto (João Victor)
R02	Perda ou corrupção de código por falta/falha de versionamento	Técnico	Baixa / Alto	Uso obrigatório do Git/GitHub desde a Aula 1, trabalhando com branches e exigindo Pull Requests com aprovação antes do merge.	Restaurar versão anterior (commit seguro) a partir do repositório remoto ou backup local.	Todos os desenvolvedores
R03	Atraso na entrega dos entregáveis/prazos da disciplina	Gestão	Média / Médio	Acompanhar o quadro de tarefas (Trello) semanalmente e definir metas/sprints curtas para cada aula.	Reduzir o escopo secundário do projeto (focar no MVP: vitrine, inscrição e confirmação de presença).	Todos os integrantes
R04	Vazamento ou exposição indevida de dados sensíveis das clientes (violação à LGPD)	Segurança / LGPD	Baixa / Muito Alto	Implementar arquitetura sem repasse de dados a terceiros; aplicar validação e consentimento obrigatório no cadastro.	Isolar o módulo afetado, revogar acessos comprometidos e auditar a base de dados imediatamente.	Back-end / Segurança (Igor)
R05	Falta de engajamento na confirmação de presença (RSVP)	Negócio / Uso	Média / Médio	Testar a jornada do usuário em dispositivos móveis (mobile-first) para garantir facilidade de confirmação via link/QR Code.	Disponibilizar formulário de confirmação manual, controlado pelos organizadores.	Front-end / UX (Igor)
R06	Falha no envio automatizado dos e-mails pós-evento (bloqueio por SPAM/SMTP)	Técnico / Integração	Média / Médio	Configurar remetente válido, autenticação SPF/DKIM e realizar testes de disparo prévios com contas externas.	Disparar em lotes menores (batches) ou disponibilizar link de acesso direto na plataforma.	Back-end (Igor)

11. Quadro de Tarefas

Print atualizado do quadro de tarefas com os cartões distribuídos:

Trello interface showing a project board titled "Celebre Wedding & Festas". The board is organized into columns representing different roles and tasks. A tooltip is visible over a card in the "Igor" column.

João Victor — Gerente de Projeto

- Aula 3 - Escolher os processos centrais do tema (1 a 3)
- Aula 3 - Consolidar PDF final com diagramas e link do repositório
- Aula 4 - Consolidar PDF final com diagrama de arquitetura e link do repositório
- Aula 4 - Definir e justificar a pilha tecnológica
- Aula 5 - Consolidar PDF final com toda a documentação do banco de dados
- Aula 5 - Organizar entrega no GitHub (pasta /banco)

Adrielly — Responsável pela Documentação

- Redigir o enunciado do problema e a justificativa
- Documentar o escopo do projeto (o que entra e o que fica de fora)
- Mantém o documento de entrega atualizado a cada etapa
- Aula 4 - Especificação textual dos 3 casos de uso críticos
- Aula 4 - Documentar o protótipo de telas e o fluxo de navegação
- Aula 5 - Escrever o script de carga de dados de teste (script_carga.sql)

Marcia — Responsável por Dados

- Levantar os dados necessários (profissionais, clientes, eventos)
- (Revisar) Aula 5 - Modelar o banco de dados do sistema
- Definir regras de armazenamento e proteção de dados (LGPD)
- Aula 4 - Modelar o diagrama de classes do domínio (mínimo 6 classes)
- Aula 4 - Revisar classes do domínio com base nos requisitos da Aula 2
- Aula 5 - Modelar o DER (modelo conceitual)

Igor — Responsável por Desenvolvimento

- Aula 4 - Diagrama de casos de uso (atores, include/extend)
- Aula 4 - Estruturar o repositório inicial (pastas, README, 1º commit de cada um)
- Aula 5 - Escrever o script DDL de criação do banco (script_criacao.sql)
- Aula 5 - Conectar a aplicação ao banco e demonstrar 1 CRUD funcionando
- Aula 6 - Implementar autenticação (login, hash, sessão, 2 perfis de acesso)
- Aula 6 - Implementar

Lucila — Responsável pelos Testes

- Testar o fluxo de inscrições e confirmação de presença
- Validar que os dados das clientes não são repassados (conformidade LGPD)
- Aula 4 - Criar o diagrama de sequência de 1 caso de uso crítico
- Aula 4 - Validar o protótipo com pessoa de fora da equipe
- Aula 5 - Escrever as consultas SQL (mínimo 8: JOIN, agregação e subconsulta)
- Aula 5 - Testar os scripts em uma base limpa antes

To Do

- Aula 3 - Montar tabela de análise de gargalos (mínimo 5)
- Aula 3 - Atualizar o documento de requisitos, se surgirem requisitos novos
- Aula 3 - Desenhar o diagrama AS-IS em BPMN (pools e lanes)
- Aula 3 - Relacionar atividades automatizadas do TO-BE aos requisitos (RF01, RF02...)
- Aula 3 - Desenhar o diagrama TO-BE em BPMN
- Aula 3 - Levantar os objetos de dados de cada atividade do processo

Doing

+ Adicionar um cartão

Caixa de entrada | Planejador | Quadro | Mudar de quadros

Jira

Trello interface showing the same project board "Celebre Wedding & Festas". The board is organized into columns representing different roles and tasks. The "Done" column is now visible on the right.

João Victor — Gerente de Projeto

- Aula 3 - Escolher os processos centrais do tema (1 a 3)
- Aula 3 - Consolidar PDF final com diagramas e link do repositório
- Aula 4 - Consolidar PDF final com diagrama de arquitetura e link do repositório
- Aula 4 - Definir e justificar a pilha tecnológica
- Aula 5 - Consolidar PDF final com toda a documentação do banco de dados
- Aula 5 - Organizar entrega no GitHub (pasta /banco)

Adrielly — Responsável pela Documentação

- Redigir o enunciado do problema e a justificativa
- Documentar o escopo do projeto (o que entra e o que fica de fora)
- Mantém o documento de entrega atualizado a cada etapa
- Aula 4 - Especificação textual dos 3 casos de uso críticos
- Aula 4 - Documentar o protótipo de telas e o fluxo de navegação
- Aula 5 - Escrever o script de carga de dados de teste (script_carga.sql)

Marcia — Responsável por Dados

- Levantar os dados necessários (profissionais, clientes, eventos)
- (Revisar) Aula 5 - Modelar o banco de dados do sistema
- Definir regras de armazenamento e proteção de dados (LGPD)
- Aula 4 - Modelar o diagrama de classes do domínio (mínimo 6 classes)
- Aula 4 - Revisar classes do domínio com base nos requisitos da Aula 2
- Aula 5 - Modelar o DER (modelo conceitual)

Igor — Responsável por Desenvolvimento

- Aula 4 - Diagrama de casos de uso (atores, include/extend)
- Aula 4 - Estruturar o repositório inicial (pastas, README, 1º commit de cada um)
- Aula 5 - Escrever o script DDL de criação do banco (script_criacao.sql)
- Aula 5 - Conectar a aplicação ao banco e demonstrar 1 CRUD funcionando
- Aula 6 - Implementar autenticação (login, hash, sessão, 2 perfis de acesso)
- Aula 6 - Implementar

Lucila — Responsável pelos Testes

- Testar o fluxo de inscrições e confirmação de presença
- Validar que os dados das clientes não são repassados (conformidade LGPD)
- Aula 4 - Criar o diagrama de sequência de 1 caso de uso crítico
- Aula 4 - Validar o protótipo com pessoa de fora da equipe
- Aula 5 - Escrever as consultas SQL (mínimo 8: JOIN, agregação e subconsulta)
- Aula 5 - Testar os scripts em uma base limpa antes

To Do

- Aula 3 - Montar tabela de análise de gargalos (mínimo 5)
- Aula 3 - Atualizar o documento de requisitos, se surgirem requisitos novos
- Aula 3 - Desenhar o diagrama AS-IS em BPMN (pools e lanes)
- Aula 3 - Relacionar atividades automatizadas do TO-BE aos requisitos (RF01, RF02...)
- Aula 3 - Desenhar o diagrama TO-BE em BPMN
- Aula 3 - Levantar os objetos de dados de cada atividade do processo

Doing

+ Adicionar um cartão

Done

- Aula 2 - Consolidar documento de requisitos e plano de projeto
- Desenvolver o módulo de inscrições e programação
- Configurar o repositório no GitHub
- Aula 2 - Levantar regras de negócio do sistema
- Aula 2 - Detalhar requisitos funcionais do sistema
- Aula 2 - Definir requisitos não funcionais relacionados a dados/LGPD
- Aula 2 - Atualizar quadro de riscos

+ Adicionar outra lista

Caixa de entrada | Planejador | Quadro | Mudar de quadros

Jira
